



Pontificia Universidad Javeriana
Fundamentos de Ingeniería de Software

DriveControl / AutoMinder Enterprise

Equipo SYNTIX TECH

Milestone 4 - Dashboard, alertas y cierre del sistema

Profesor: Luis Gabriel Moreno Sandoval
Fecha: 19 de mayo de 2026
Repositorio: https://github.com/puj-course/FIS_2610_3517_G4

Índice

1. Resumen ejecutivo del milestone	2
2. Objetivos del milestone	2
3. Alcance funcional	2
4. Evidencia ágil	2
5. Métricas del milestone	3
6. Evaluación del producto	4
7. Evaluación del proceso	4
8. Evaluación del esfuerzo	4
9. Postmortem del milestone	4
9.1. Qué salió bien	4
9.2. Qué salió mal	4
9.3. Causas raíz	4
9.4. Impacto	4
9.5. Acciones correctivas	4
9.6. Acciones preventivas y responsables sugeridos	5
10.Retrospectiva estrella de mar	5
10.1. Comenzar a hacer	5
10.2. Más de	5
10.3. Seguir haciendo	5
10.4. Menos de	5
10.5. Dejar de hacer	5
11.Plan de mejora final	6
12.Conclusión del milestone	6
13.Anexos o evidencias pendientes	6

1. Resumen ejecutivo del milestone

El Milestone 4 cerró dashboard, alertas, CI/CD, Docker, SonarCloud, SMS/Twilio, métricas y evidencia final. GitHub live registra 132 issues cerradas, 20 HU cerradas estrictas y 3 PRs asociados, con el PR #628 abierto.

2. Objetivos del milestone

- Consolidar dashboard y alertas documentales.
- Evidenciar Docker, CI/CD, SonarCloud y SMS.
- Centralizar la entrega final de rúbrica.
- Cerrar postmortem técnico y de proceso.

3. Alcance funcional

El alcance incluye cierre del sistema, métricas de calidad, despliegue, SMS, evidencia y documentación. No incluye releases/tags porque no existen verificables.

4. Evidencia ágil

Elemento	Valor	Evidencia
HU cerradas	20	Issues con patrón estricto de HU.
Issues cerradas	132	Milestone cerrado para issues.
PRs	3	PRs #232, #488 y #628.
Commits	277	Ventana S11-S13 en Git local.



12	Consolidar entrega técnica final según rúbrica #618	Sarm-m	Done	High	M
13	Consolidar métricas de calidad, SonarCloud y coverage #619	Sarm-m	Done	High	M
14	Validar Docker Compose, red Docker y despliegue local #620	Sarm-m	Done	High	M
15	Documentar CI/CD, DockerHub y validación de workflows #621	Sarm-m	Done	Medium	M
16	Consolidar SMS, seguridad de entorno y paquete final de evidencia #622	Sarm-m	Done	High	M

Figura 1: Issues finales de Sprint 13.

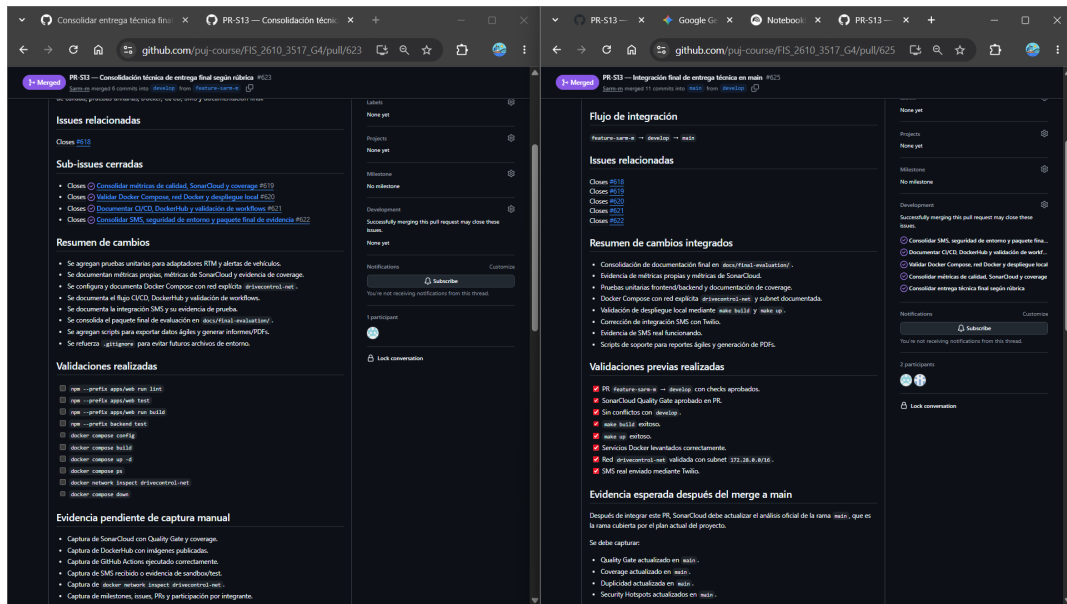


Figura 2: PRs finales.

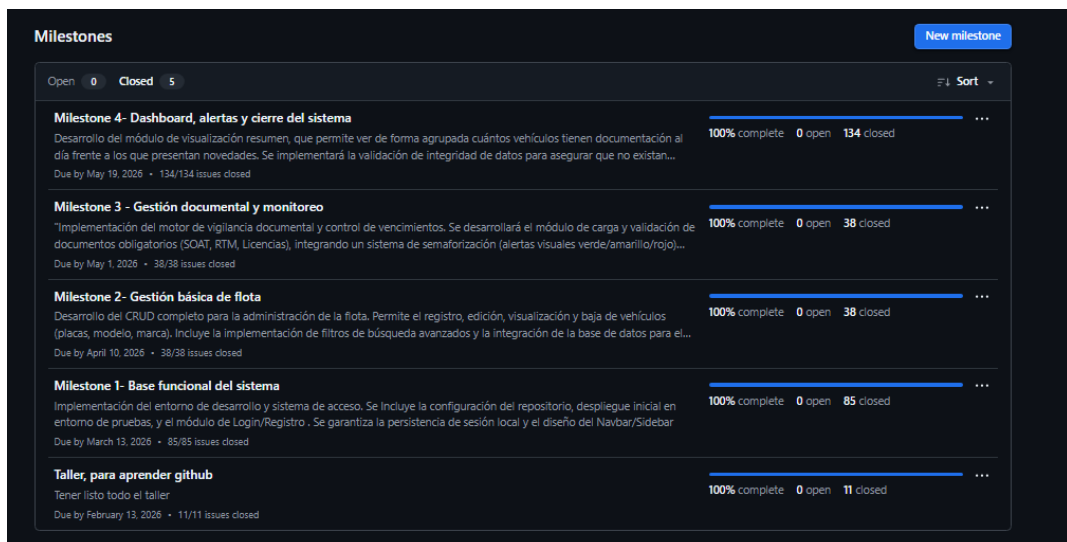


Figura 3: Milestones del semestre.

5. Métricas del milestone

Métrica	Valor
HU cerradas	20
Issues cerradas	132
Issues abiertas	0
Commits por ventana de sprint	277
PRs asociados	3
PRs mergeadas	2
PRs abiertas	1

Participación por issues asignadas: samuelfl680 56, Sarm-m 43, solonlosada2006 30, juanvargax

22 y Juserora 17.

6. Evaluación del producto

Se produjo el cierre funcional y documental del sistema con evidencia de calidad, despliegue, SMS y metodología. El PR #628 queda explícitamente pendiente.

7. Evaluación del proceso

El proceso se enfocó en cierre de rúbrica, PRs, CI/CD y evidencia. Funcionó la respuesta asíncrona ante bloqueos, pero faltó planear releases/tags.

8. Evaluación del esfuerzo

El esfuerzo fue alto: 277 commits en S11-S13 y 132 issues cerradas. La participación estuvo concentrada en cierre técnico, DevOps, QA y documentación.

9. Postmortem del milestone

9.1. Qué salió bien

Se centralizó evidencia final, se documentó CI/CD, Docker, SonarCloud y SMS, y se cerraron issues críticas.

9.2. Qué salió mal

Quedó abierto el PR #628, no hay releases/tags y parte de la evidencia se recolectó bajo presión.

9.3. Causas raíz

La causa raíz principal fue tratar algunas validaciones funcionales y evidencias como actividades de cierre, no como parte del DoD permanente.

9.4. Impacto

El impacto es una integración pendiente y trazabilidad por versión limitada.

9.5. Acciones correctivas

Resolver o justificar PR #628, documentar ausencia de releases y exigir prueba funcional local antes de PR.

9.6. Acciones preventivas y responsables sugeridos

QA Lead debe custodiar prueba funcional; Configuration Manager debe definir versión; Product Owner debe documentar datos demo; DevOps debe vigilar SonarCloud temprano.

10. Retrospectiva estrella de mar

10.1. Comenzar a hacer

- Definir política de releases o justificar su ausencia.
- Ejecutar pruebas funcionales locales antes de PRs de cierre.
- Documentar datos demo coherentes con el usuario activo.

10.2. Más de

- Monitorear SonarCloud durante todo el sprint.
- Revisar PRs con criterio funcional.
- Capturar evidencia al validar cada flujo.

10.3. Seguir haciendo

- Mantener trazabilidad entre issues, PRs, commits y capturas.
- Usar Docker Compose para reproducibilidad.
- Responder colaborativamente ante bloqueos de cierre.

10.4. Menos de

- Acumular evidencia para los últimos días.
- Depender del pipeline como única validación.
- Usar datos demo sin reglas de consistencia.

10.5. Dejar de hacer

- Abrir PRs de cierre sin validación funcional.
- Ignorar hotspots o coverage hasta el final.
- Presentar releases si no son verificables.

11. Plan de mejora final

Acción	Responsable	Evidencia esperada	Criterio de éxito
Resolver PR pendiente	QA Lead / equipo	PR cerrado o justificado	Cierre sin ambigüedad
Definir política de versión	Configuration Manager	Tag/release o decisión	Trazabilidad clara
Validar antes de PR	QA Lead	Checklist	Menos regresiones
Documentar datos demo	Product Owner	Guía de datos	Alertas reproducibles

12. Conclusión del milestone

M4 cerró el sistema con evidencia técnica y metodológica suficiente. Los pendientes se declaran sin inventar datos: PR #628 abierto y ausencia de releases/tags verificables.

13. Anexos o evidencias pendientes

- Pendiente: cierre o justificación de PR #628.
- No existen releases/tags verificables.
- Pendiente de exportación desde GitHub API: reviews completas por PR.
